



工事報告書


2014年9月4日 赤坂スバルビル1F共用部照明改修工事

作業時間:9:00 ~ 12:30

作業人数:1人

作業内容:450口スクエアライトの蛍光灯をLEDブロックモジュールへ変更

■ 作業前

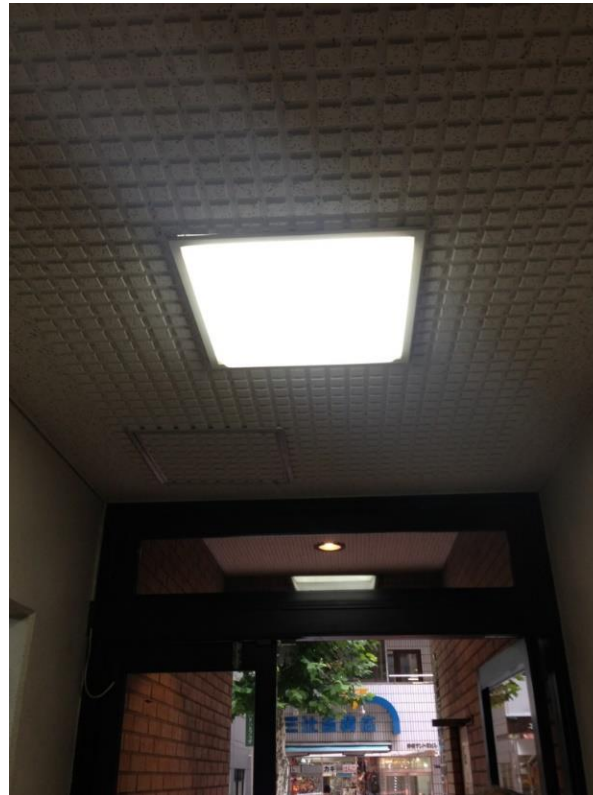

直下照度(床上1m) : 260lx
全体的にも薄暗い印象を受けます。

■ 作業中風景



丸型蛍光灯の照度が減衰していて
十分な明るさが出ていないので取り外す作業

■ 作業中風景



PRIME STAR



LEDブロックモジュールを敷き詰めていく作業
照度の確認をしながら数の調整を行っていきます。



■作業後



直下照度(床上1m) : 370lx

入口付近はモジュールの数を増やし照度を上げています。

■ 作業後

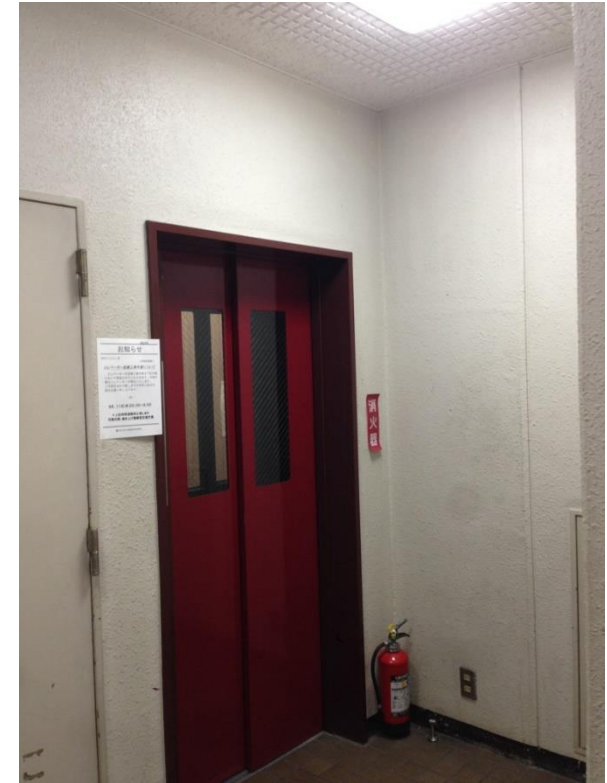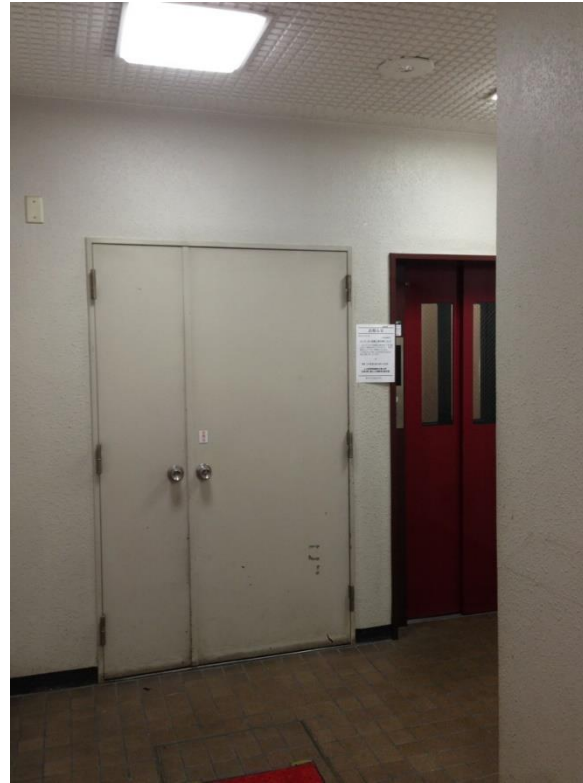

直下照度(床上1m) : 324lx

最奥にあるエレベーター前もモジュールの数を増やし照度を上げます。
共用部全体的にもスッキリと明るく改善。
